



Straßen.NRW


Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

57 verbinden - Digitale Fragerunde - 26.10.2023

Streckenzug B508/B62 – 57-verbinden



Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

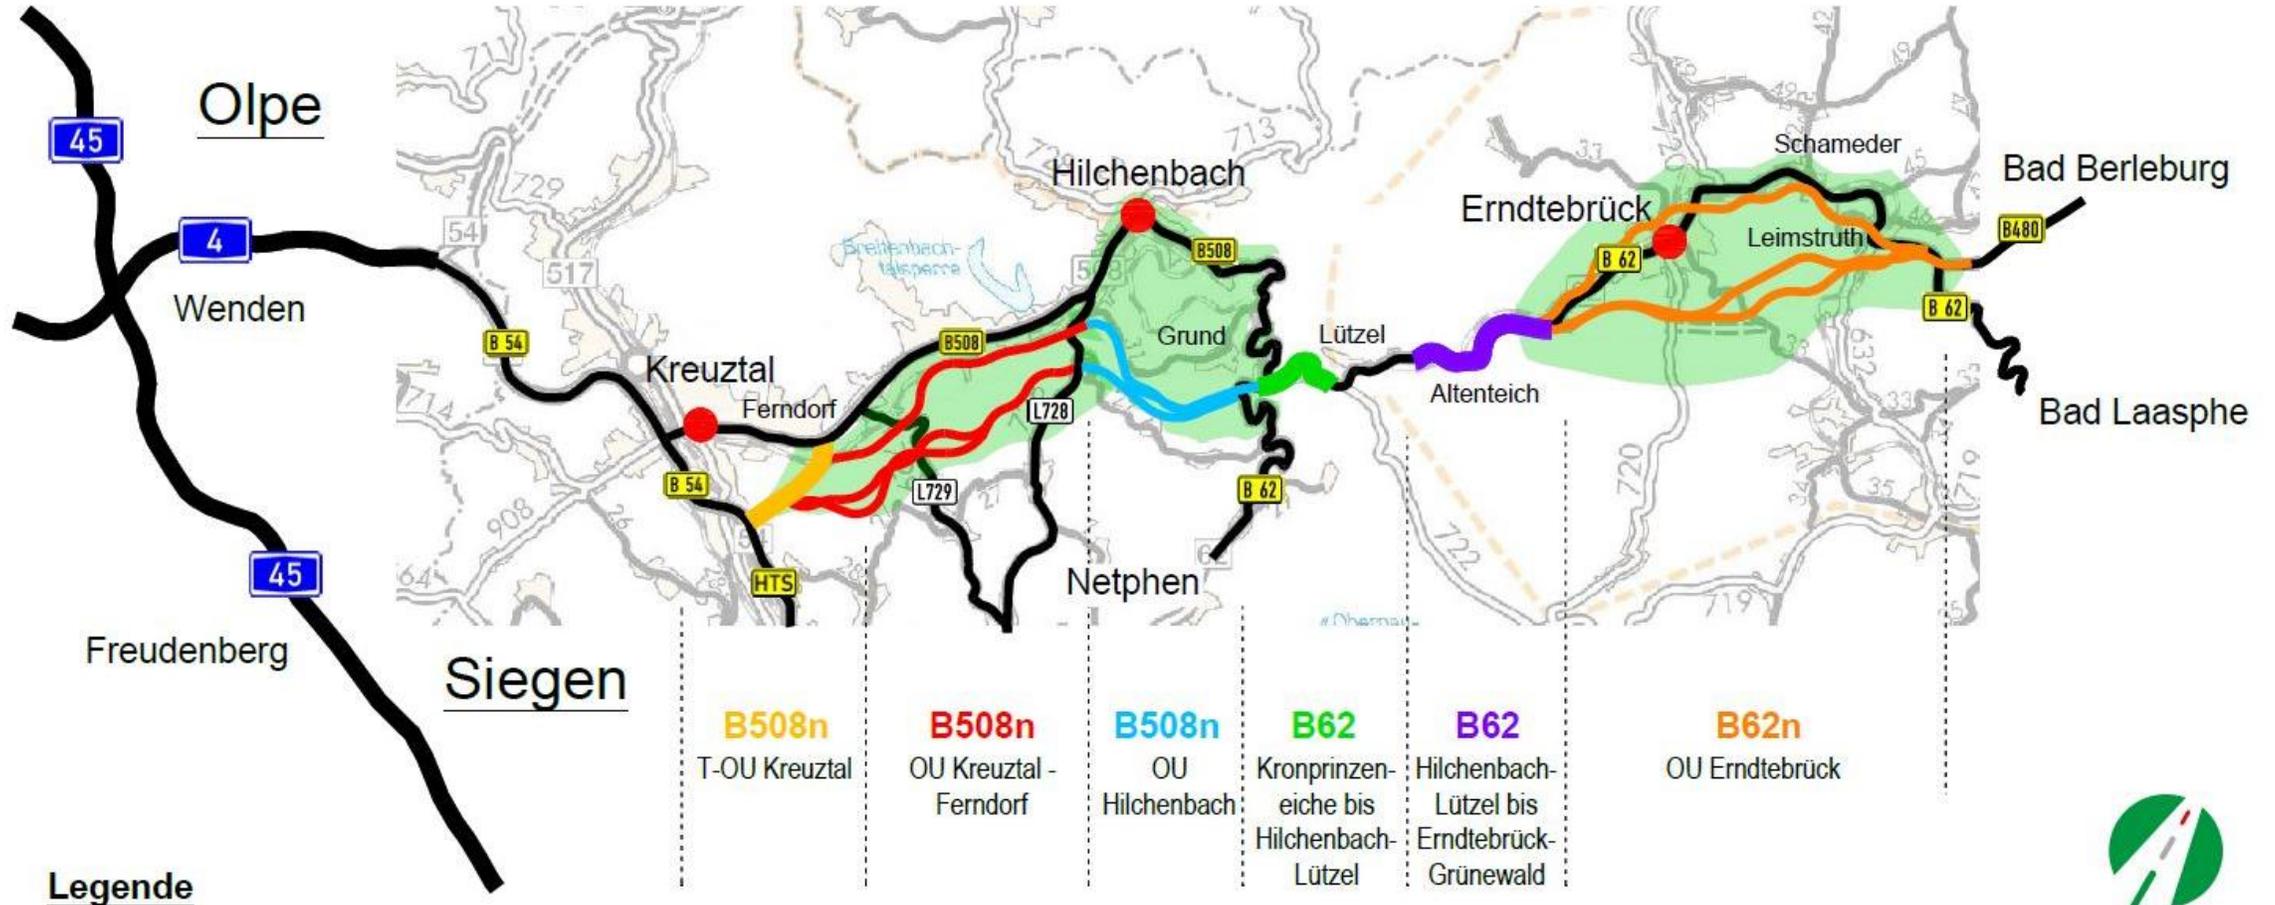

Legende

Untersuchungsraum der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

Hinweis:

Die abgebildeten Linien der B508n OU Kreuztal-Ferndorf, B508n OU Hilchenbach und B62n OU Erndtebrück stellen eine Auswahl verschiedener Varianten dar.




Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

bisher (seit 2018):

- Offenlegung des Planfeststellungsbeschlusses
 - 2 Klagen und 1 Antrag auf aufschiebende Wirkung
- Vergleichsvorschlag des OVG; Beschränkung der sofortigen Vollziehbarkeit auf einzelne Maßnahmen:
 - Herstellung eines Straßendamms sowie eines RRB und eines RKB (vorbereitende Maßnahmen)
 - Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen
- Vergabe Entwurfsplanung Brückenbauwerke
- 05.02.2021 OVG-Verhandlung u. -Urteil:
 - Abwägungsmangel bei festgesetzten, naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen
 - Planfeststellungsbeschluss: in einem Punkt rechtswidrig und nicht vollziehbar
- 15.08.2023 Planergänzungsverfahren zum OVG-Urteil wurde bei der BR Arnsberg eingereicht

nächste Schritte:

- Offenlage der Unterlagen

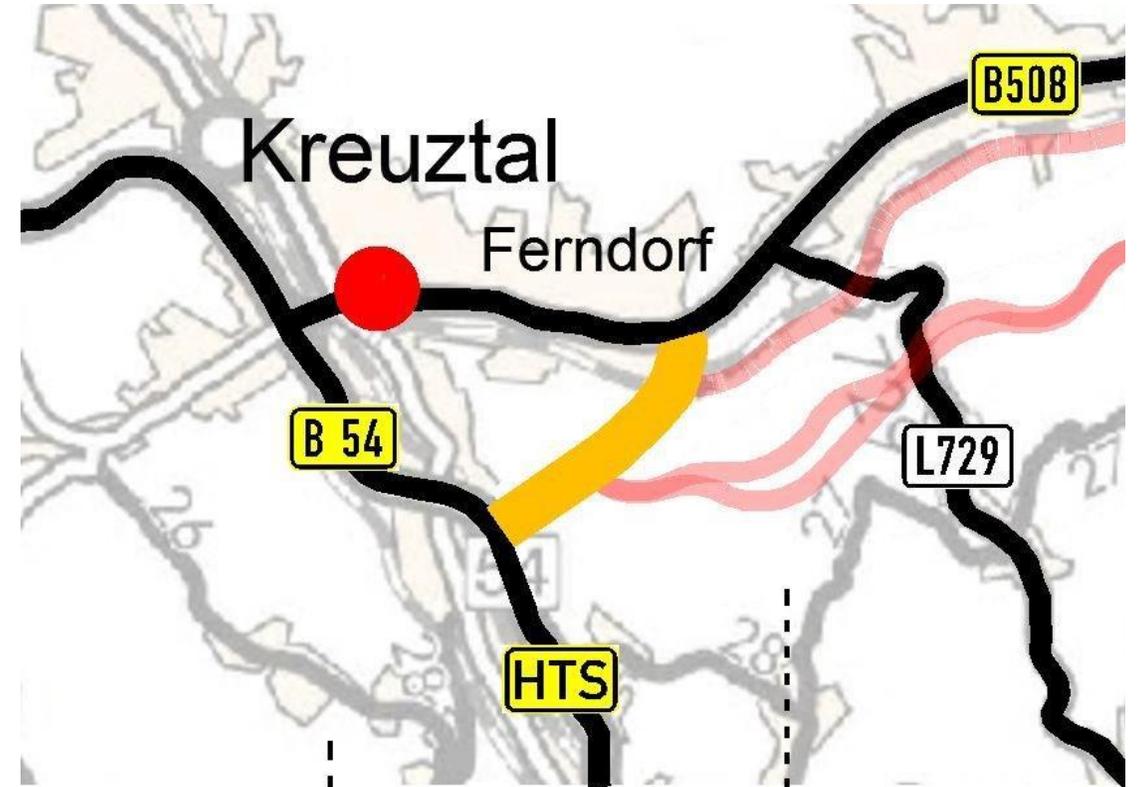


bisher (seit 2016):

- Beauftragung Verkehrsgutachten Streckenzug B508/B62
- Beginn UVS (inkl. Faunistische Planungsraumanalyse (FPA))
- 1. AK-Termin UVS
- Beauftragung faunistische Kartierung
- Beauftragung Artenschutzbeitrag
- Beginn „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“
- Verkehrsgutachten: Analyse Bestandsnetz / Prognose-Bezugsfall 2030
- Fertigstellung Artenschutzbeitrag
- 2. AK-Termin UVS (Raumwiderstandskarte)

nächste Schritte:

- Variantenuntersuchung mit Anpassung Verkehrsprognosen
- Projektabstimmungstermin Bund/Land
- 3. AK-Termin UVS
- ⋮
- Linienbestimmungsverfahren → Linienbestimmung

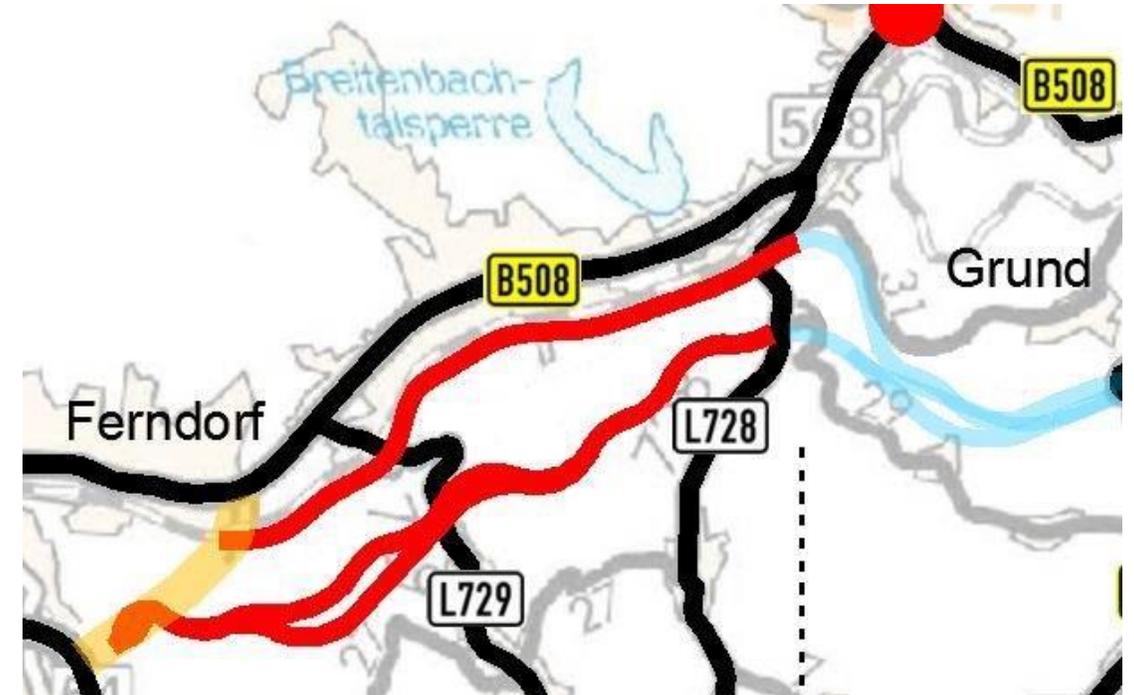


bisher (seit 2016):

- Beauftragung Verkehrsgutachten Streckenzug B508/B62
- Beginn UVS (inkl. FPA und FFH-Verträglichkeitsprüfung)
- 1. AK-Termin UVS
- Beginn Variantenuntersuchung
- Beginn „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“
- Verkehrsgutachten: Analyse Bestandsnetz / Prognose-Bezugsfall 2030
- Beauftragung faunistische Kartierung
- Durchführung Kartierungsarbeiten im Untersuchungsraum

nächste Schritte:

- Beauftragung Artenschutzbeitrag
- Auswertung Kartierungsarbeiten (Raumwiderstandskarte)
- 2. AK-Termin UVS
- ⋮
- Linienbestimmungsverfahren → Linienbestimmung

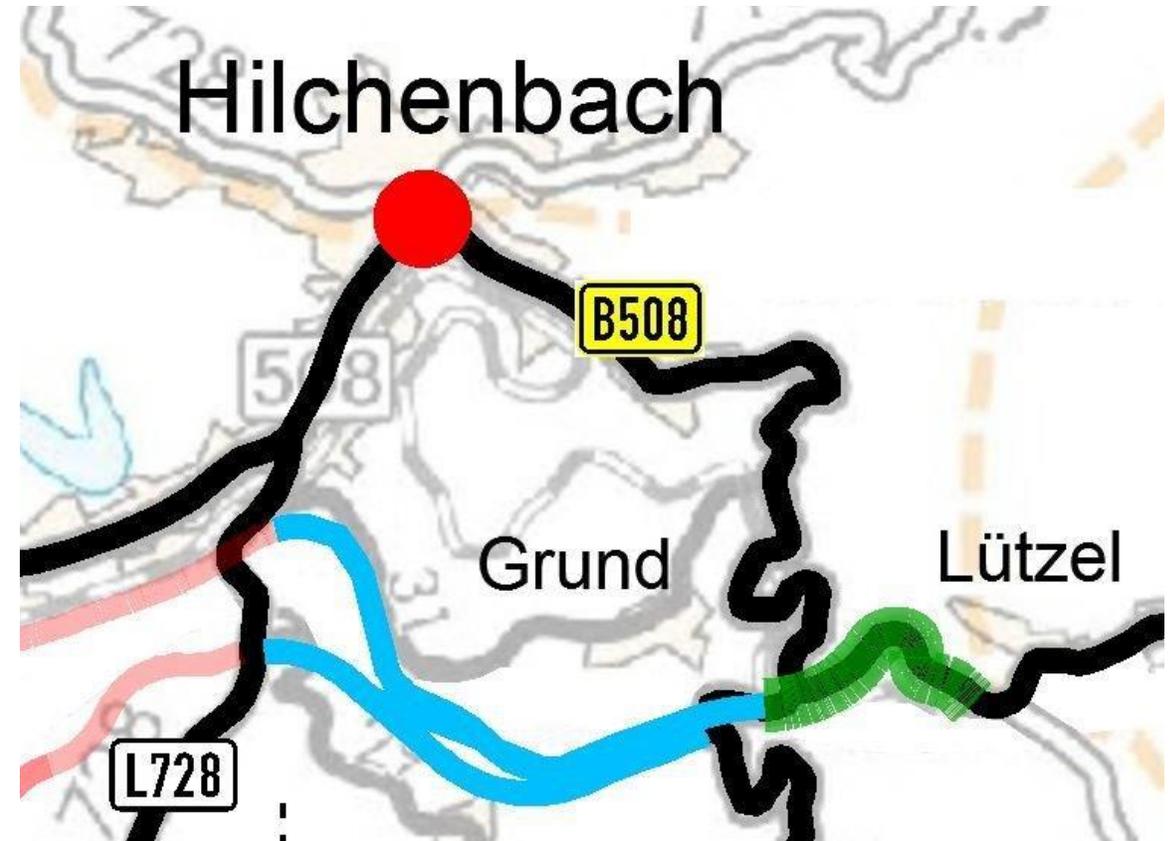

B62 Kronprinzeneiche bis Lützel



bisher (seit 2013):

- 2013 Auftreten von Standsicherheitsproblemen / drohender Hangrutsch
- 2014 B62 OU Lützel ist aus naturschutzfachlichen Gründen nicht umsetzbar → Ausbau im Bestand
- 2014 Beginn der Ausbaumaßnahme
 - 1. Bauabschnitt von Aug. 2014 bis Nov. 2016
 - 2. Bauabschnitt von Nov. 2016 bis Dez. 2019
- Dez. 2019 Fertigstellung der Gesamtmaßnahme

bisher (seit 2014):

- 2014 B62 OU Lützel ist aus naturschutzfachlichen Gründen nicht umsetzbar
→ Ausbau im Bestand
- straßenplanerischer und wassertechnischer Entwurf, naturschutzfachliche Planung
- Brückenplanung
- Abstimmung mit BR Arnsberg wegen Flurbereinigungsverfahren
- Abstimmung mit DB wegen BÜ Altenteich
- Beauftragung Planung gem. Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
- Erstellung Fachbeitrag zur EG-Wasserrahmenrichtlinie
- Abstimmung DB wegen Planung BÜ Grünwald
- Abstimmung mit Gemeinde Erndtebrück und Stadt Hilchenbach wegen Radwegführung
- 2. AK-Termin Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
- Vorlage Entwurfsplanung zur Genehmigung



nächste Schritte:

- Einleitung Flurbereinigungsverfahren
- Vorbereitung Planfeststellungsverfahren
- Planfeststellungsverfahren
- ⋮
- Planfeststellungsbeschluss

bisher (seit 2016):

- Beauftragung Verkehrsgutachten Streckenzug B508/B62
- Beginn UVS (inkl. FPA und FFH-Verträglichkeitsprüfung)
- Vorabstimmungen zu möglichen Varianten
- 1. AK-Termin UVS
- Beginn Variantenuntersuchung
- Beginn „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“
- Verkehrsgutachten: Analyse Bestandsnetz / Prognose-Bezugsfall 2030
- Beauftragung faunistische Kartierung

nächste Schritte:

- Durchführung faunistische Kartierung
- Beauftragung Artenschutzbeitrag
- 2. AK-Termin UVS
- ⋮
- Linienbestimmungsverfahren → Linienbestimmung

